

INFORME DE INVERSIÓN REGIONAL

DIRECCION DE ARQUITECTURA

DICIEMBRE 2010


PMG GESTIÓN TERRITORIAL

INVERSIÓN MANDANTES REGIONALES DICIEMBRE 2010 (FNDR Y MÚLTIPLES FINANCIAMIENTOS)

En relación a los proyectos de mandantes, donde la Dirección de Arquitectura actúa como unidad técnica de ejecución, aproximadamente el 70% de esta inversión corresponde a encargos de Gobiernos Regionales y a financiamientos mixtos que incluye participación de los Gobiernos Regionales y otros, denominado “Múltiples Financiamientos”

El Programa de Mejoramiento de Gestión Territorial, incluye entre sus objetivos, difundir los avances en la inversión y las iniciativas que se encuentran en curso, para ello se ha preparado un reporte que se actualizará una vez al mes.

El siguiente gráfico presenta **106 contratos con Fondos Regionales (FNDR) y Múltiple Financiamiento**, extraídos del total de contratos **en Ejecución a diciembre de 2010**:

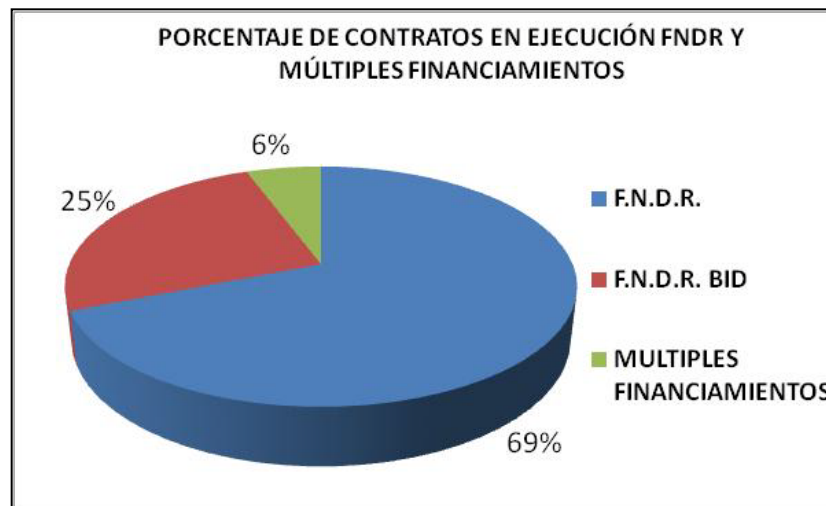

Se identifican **6 contratos de Múltiples Financiamientos (6 %)** y **100 contratos con fondos FNDR (94%)**, este último grupo incluye **27 contratos relacionados con el préstamo BID**, los que han sido destacados con color en los listados de cada región.

En la siguiente página, se muestra un resumen de inversión nacional que incluye los **106 Diseños y Obras en Ejecución con tipo de fondo FNDR y Múltiples Financiamientos**. Posteriormente, se entrega un listado detallado por región.

Dirección de Arquitectura - Departamento de Análisis y Gestión							
CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)							
DICIEMBRE 2010							
Fecha de datos 03/01/2011				Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación			
	REGIÓN	CTOS	MONTO VIGENTE	INVERSION AÑO	INVERSION ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	% INV. AÑO
15	ARICA	7	667.747.519	208.802.139	217.412.139	450.335.380	0,60%
1	TARAPACA	7	1.219.302.619	721.182.751	742.207.751	477.094.868	2,07%
2	ANTOFAGASTA	6	9.672.469.540	5.340.100.886	5.669.393.236	4.003.076.304	15,29%
3	ATACAMA	8	16.304.457.808	7.721.812.163	8.640.425.523	7.664.032.285	22,12%
4	COQUIMBO	7	2.587.471.622	1.615.974.440	1.798.164.110	789.307.512	4,63%
5	VALPARAISO	13	7.467.897.327	2.846.425.486	4.191.994.392	3.275.902.935	8,15%
6	LIBERTADOR B.O	7	2.003.717.206	929.762.666	1.020.245.855	983.471.351	2,66%
7	MAULE	13	11.166.003.917	5.309.042.396	6.893.002.069	4.273.001.848	15,21%
8	BIO-BIO	2	645.156.485	189.840.337	189.840.337	455.316.148	0,54%
9	ARAUCANIA	20	11.981.717.890	5.103.685.513	7.047.195.711	4.934.522.179	14,62%
14	LOS RIOS	5	5.909.383.435	2.805.780.950	3.217.625.212	2.691.758.223	8,04%
10	LOS LAGOS	5	1.340.282.362	0	23.970.000	1.316.312.362	0,00%
11	AYSEN	1	5.093.370.456	467.109.829	467.109.829	4.626.260.627	1,34%
12	PUNTA ARENAS	5	7.031.848.195	1.656.075.873	1.656.075.873	5.375.772.322	4,74%
13	METROPOLITANA	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL REGIONAL		106	83.090.826.381	34.915.595.429	41.774.662.037	41.316.164.344	100,00%
16	NIVEL CENTRAL	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL NACIONAL		106	83.090.826.381	34.915.595.429	41.774.662.037	41.316.164.344	100,00%

Nota: Los montos incluidos en la tabla resumen y en los cuadros siguientes por región, se encuentran expresados en pesos (\$)

REGION DE ARICA Y PARINACOTA
CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)
DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO				
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	
CONTRATOS DE DISEÑO															
79	1	Claudio Magna Hatte	F.N.D.R.	ARICA	IPYARQ	REPOSICION SUBOFICINA CARDENAL SILVA HENRIQUEZ - SRCEI ARICA	285	13-08-2010	24-05-2011		0	15.500.000	3.875.000	3.875.000	11.625.000
30	2	Claudio Magna Hatte	F.N.D.R.	ARICA	IPYARQ	AMPLIACION OFICINA REGIONAL JUNAEB REGION DE ARICA Y PARINACOTA	150	23-07-2009	19-12-2009		0	11.500.000	0	1.150.000	10.350.000
49	1	Fabiola Castro Flores	F.N.D.R.	ARICA	IPYARQ	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SECTOR EL ALTO, ARICA	315	13-08-2010	23-06-2011		0	29.000.000	2.900.000	2.900.000	26.100.000
19	2	Fabiola Castro Flores	F.N.D.R.	ARICA	IPYARQ	CONSTRUCCION DEPENDENCIAS CATEDRAL SAN MARCOS, ARICA	275	03-04-2009	02-01-2010		0	18.650.000	6.527.500	13.987.500	4.662.500
66	1	Fermin Mateo Lagos	F.N.D.R. - BID - PATRIMONIO	ARICA	IPYARQ	RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL CATEDRAL SAN MARCOS DE ARICA	150	05-03-2010	01-08-2010		0	23.174.657	8.111.130	8.111.130	15.063.527
68	1	Fermin Mateo Lagos	F.N.D.R. - BID - PATRIMONIO	ARICA	IPYARQ	RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL EXADUANA ARICA	180	05-03-2010	31-08-2010		0	17.102.400	5.955.840	5.955.840	11.146.560
								Cttos.	6	0	114.927.057	27.369.470	35.979.470	78.947.587	
CONTRATOS DE OBRA															
50	2	Fabiola Castro Flores	F.N.D.R.	ARICA	REPOS	JARDIN INFANTIL SANTA ROSA CON AMPLIACION A SALA CUNA	300	21-04-2010	14-02-2011		670	552.820.462	181.432.669	181.432.669	371.387.793
								Cttos.	1	670	552.820.462	181.432.669	181.432.669	371.387.793	
TOTAL REGION								Cttos.	7	670	667.747.519	208.802.139	217.412.139	450.335.380	

REGION DE TARAPACA

CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO			
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR
CONTRATOS DE DISEÑO														
185	1 Alexis Gajardo Velasquez	F.N.D.R.	HUARA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE MOCHA, HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL	455	18-04-2009	16-07-2010		0	20.970.000	9.436.500	14.679.000	6.291.000
190	1 Alexis Gajardo Velasquez	F.N.D.R.- BID - PATRIMON	CAMIÑA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE INAMA, CAMIÑA	394	18-06-2009	16-07-2010		0	21.670.000	2.167.000	7.584.500	14.085.500
243	1 Alexis Gajardo Velasquez	F.N.D.R.	IQUIQUE	PYARQ	AMPLIACION OFICINAS REGISTRO CIVIL DE IQUIQUE	136	20-04-2010	02-09-2010		2.688	30.937.500	0	0	30.937.500
189	1 Alexis Gajardo Velasquez	F.N.D.R.- BID - PATRIMON	HUARA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE HUASQUINA, HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL	372	18-06-2009	24-06-2010		0	20.200.000	2.020.000	7.070.000	13.130.000
186	1 Alexis Gajardo Velasquez	F.N.D.R.	HUARA	PYARQ	IGLESIA DE LIMACSIÑA, HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL	413	29-04-2009	15-06-2010		0	21.260.000	9.567.000	14.882.000	6.378.000
							Cttos.	5	2.688		115.037.500	23.190.500	44.215.500	70.822.000
CONTRATOS DE OBRA														
206	01 Andrés Dinamarca	F.N.D.R.- BID - PATRIMON	CAMIÑA	RESTA	IGLESIA DE CAMIÑA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL	300	30-06-2010	25-04-2011		779	350.024.844	14.192.083	14.192.083	335.832.761
88	3 Christian Espinoza Díaz	MULTIPLE IS FINANCIAM	IQUIQUE	CONST	2a. ETAPA EDIFICIO SEREMA EDUCACION I REGION	462	01-09-2009	06-12-2010		1.500	754.240.275	683.800.168	683.800.168	70.440.107
							Cttos.	2	2.279		1.104.265.119	697.992.251	697.992.251	406.272.868
TOTAL REGION							Cttos.	7	4.967		1.219.302.619	721.182.751	742.207.751	477.094.868

REGION DE ANTOFAGASTA

CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO				
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	
CONTRATOS DE DISEÑO															
							Cttos.	0	0	0	0	0	0	0	
CONTRATOS DE OBRA															
174	6	CRISTIAN COLVILLE PARRA	F.N.D.R.	CALAMA	ASESO	ASESORIA ITO LICEO B8	390	27-07-2010	20-08-2011		0	119.500.000	35.681.720	35.681.720	83.818.280
174	4	CRISTIAN COLVILLE PARRA	F.N.D.R.	CALAMA	AMPLI	LICEO B8 FCO DE AGUIRRE	799	21-10-2009	28-12-2011		7.500	4.040.910.102	1.772.641.597	1.802.574.265	2.238.335.837
172	4	Elizabeth Alonso	F.N.D.R.	OLLAGÜE	CONST	OFICINA PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA - SEDE SOCIAL - TALLERES OLLAGUE	283	16-02-2010	25-11-2010		0	538.630.771	403.061.960	403.061.960	135.568.811
164	3	Raúl Salazar Villena	F.N.D.R.	ANTOFAGASTA	AMPLI	SML Antofagasta	390	24-02-2010	20-03-2011		1.056	917.559.915	511.265.026	511.265.026	406.294.889
155	2	Rolando Martínez	F.N.D.R.	TOCOPILLA	REPOS	EDIFICIO MUNICIPAL MARIA ELENA	453	12-09-2009	08-12-2010		3.106	3.062.737.446	2.617.450.583	2.916.810.265	145.927.181
165	4	Viviana Fuentes Orellana	F.N.D.R.	CALAMA	CONST	CASA ACOGIDA VICTIMA DE LA VIF EL LOA	305	14-09-2010	15-07-2011		920	993.131.306	0	0	993.131.306
							Cttos.	6	12.582	9.672.469.540	5.340.100.886	5.669.393.236	4.003.076.304		
TOTAL REGION							Cttos.	6	12.582	9.672.469.540	5.340.100.886	5.669.393.236	4.003.076.304		

REGION DE ATACAMA

CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO				
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	
CONTRATOS DE DISEÑO															
130	1 Sergio Cabezas G.	F.N.D.R.- BID - PATRIMONIO	FREIRINA	IPYARQ	RESTAURACION IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA	446	01-10-2009	20-12-2010		0	58.297.719	21.800.000	29.975.000	28.322.719	
							Cttos.	1		0	58.297.719	21.800.000	29.975.000	28.322.719	
CONTRATOS DE OBRA															
97	8 Ariel Labra Olivares	F.N.D.R.	VALLENAR	CONST	Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO CAJ	334	05-01-2010	04-12-2010		538	444.399.323	407.800.753	407.800.753	36.598.570	
141	1 Juan Carlos Guerra C.	F.N.D.R.	COPIAPO	CONST	INSTITUTO DE REHABILITACION TELETON	326	19-01-2010	10-12-2010		2.478	2.711.344.278	1.159.211.796	1.159.211.796	1.552.132.482	
140	1 Juan Carlos Guerra C.	MULTIPLES FINANCIAM	COPIAPO	REPOS	ESTADIO LUIS VALENZUELA HERMOSILLA	430	06-11-2009	09-01-2011		3.744	5.722.384.324	2.226.294.243	2.244.317.754	3.478.066.570	
141	3 Paula Ovalle Molina	F.N.D.R.	COPIAPO	ASESO	INSTITUTO DE REHABILITACION TELETON (AIF) 2	330	08-04-2010	03-03-2011		2.478	20.250.000	8.133.870	8.133.870	12.116.130	
86	4 Rolando Yañez	F.N.D.R.	DIEGO DE ALMAGRO	REPOS	ESCUELA ALIRO LAMAS C.	540	10-06-2009	01-12-2010		4.110	2.853.604.914	1.652.465.815	2.544.880.664	308.724.250	
111	6 Rolando Yañez	F.N.D.R.	CHAÑARAL	ASESO	LICEO FEDERICO VARELA AIF 2	480	01-03-2010	23-06-2011		0	16.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
111	4 Rolando Yañez	F.N.D.R.	CHAÑARAL	REPOS	LICEO FEDERICO VARELA	477	11-11-2009	02-03-2011		6.616	4.478.177.250	2.238.105.686	2.238.105.686	2.240.071.564	
							Cttos.	7		19.964	16.246.160.089	7.700.012.163	8.610.450.523	7.635.709.566	
TOTAL REGION								Cttos.	8		19.964	16.304.457.808	7.721.812.163	8.640.425.523	7.664.032.285

REGION DE COQUIMBO

CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO				
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	
CONTRATOS DE DISEÑO															
358	1	Carlos de la Barra	F.N.D.R.	LOS VILOS	IPYARQ	CUARTEL BICRIM LOS VILOS	215	23-06-2010	23-01-2011		752	22.948.000	6.884.400	6.884.400	16.063.600
359	2	Carlos de la Barra	F.N.D.R.		IPYARQ	CONSULTORIO GENERAL URBANO DE SAN JUAN	200	30-09-2010	17-04-2011		5.883	44.868.019	0	0	44.868.019
345	3	Francisco Guerra Jeraldo	F.N.D.R.- BID	LA SERENA	IPYARQ	RESTAURACION ESTRUCTURAL IGLESIA DE ANDACOLLO	227	23-06-2010	04-02-2011		733	36.843.000	11.052.900	11.052.900	25.790.100
343	2	Francisco Guerra Jeraldo	F.N.D.R.- BID - PATRIMON	LA SERENA	IPYARQ	REPARACION CASA DE GABRIELA MISTRAL LAS PALMERAS	491	01-09-2009	04-01-2011		149	10.900.000	3.270.000	6.540.000	4.360.000
344	2	Francisco Guerra Jeraldo	F.N.D.R.- BID - PATRIMON	LA SERENA	IPYARQ	CASA GABRIELA MISTRAL EN LAS COMPAÑIAS	528	27-07-2009	05-01-2011		288	16.500.000	4.950.000	9.900.000	6.600.000
								Cttos.	5		7.805	132.059.019	26.157.300	34.377.300	97.681.719
CONTRATOS DE OBRA															
350	1	CRISTIAN LAOLIVA OJEDA	F.N.D.R.	LA SERENA	AMPLI	MUSEO ARQUEOLOGIO DE LA SERENA	490	23-01-2010	27-05-2011		1.998	1.286.881.143	656.486.571	656.486.571	630.394.572
346	1	Gilberto Pérez Canto	F.N.D.R.	LA SERENA	CONST	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI LAS COMPAÑIAS	455	15-09-2009	13-12-2010		1.805	1.168.531.460	933.330.569	1.107.300.239	61.231.221
								Cttos.	2		3.803	2.455.412.603	1.589.817.140	1.763.786.810	691.625.793
TOTAL REGION								Cttos.	7		11.608	2.587.471.622	1.615.974.440	1.798.164.110	789.307.512

REGIÓN DE VALPARAÍSO
CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTG.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO			
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR
CONTRATOS DE DISEÑO														
1501	Ana Paz Cárdenas	F.N.D.R.	PETORCA	ASES	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR IGLESIA DE PETORCA Y SU ENTORNO	195	03-11-2009	16-05-2010		0	43.200.000	23.750.000	23.750.000	19.450.000
1591	ELLA KARINA ENGLANDER KALDERON	F.N.D.R.- BID	QUILPUE	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA LOS PERALES, CONVENTO Y ENTORNO, COMUNA DE	180	30-05-2009	25-11-2009		1.443	41.480.000	16.592.000	29.036.000	12.444.000
1831	ELLA KARINA ENGLANDER KALDERON	F.N.D.R.- BID	EL TABO	ESPEC	Levantamiento expediente barrio Vaticano y Quirinal, comuna el Tabo	210	03-11-2009	31-05-2010		18.200	14.350.000	5.022.500	5.022.500	9.327.500
1671	Javier Méndez Torrico	F.N.D.R.- BID - PATRIMON	VALPARAISO	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA SAN FRANCISCO DEL BARON	245	02-09-2009	04-05-2010		0	77.400.000	19.350.000	38.700.000	38.700.000
1111	Maria I. Montes	F.N.D.R.	LOS ANDES	ACARQ	RESTAURACION EDIFICIO GOBERNACION DE LOS ANDES	180	11-09-2009	09-03-2010		2.840	48.320.000	12.080.000	24.160.000	24.160.000
1511	ELLA KARINA ENGLANDER KALDERON	F.N.D.R.- BID - PATRIMON	SAN FELIPE	PREFA	DISEÑO RESTAURACION IGLESIA Y MONASTERIO DEL BUEN PASTOR DE SAN FELIPE	630	28-05-2009	16-02-2011		0	82.648.114	54.057.778	61.057.289	21.590.825
							Cttos.	6	22.483		307.398.114	130.852.278	181.725.789	125.672.325
CONTRATOS DE OBRA														
1143	Horacio Montenegro Iturra	F.N.D.R.	SAN ANTONIO	CONST	REPOSICION CUARTEL POLICIA INVESTIGACIONES DE SAN ANTONIO	420	28-08-2009	21-10-2010		915	1.102.690.185	767.086.893	880.571.611	222.118.574
1782	José Pedro Urzúa P.	MULTIPLE FINANCIAM	QUILLOTA	REPOS	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLOTA (RESCATE ARQUEOLOGICO)	30	27-03-2009	25-04-2009		0	93.022.506	0	59.431.055	33.591.451
1783	José Pedro Urzúa P.	MULTIPLE FINANCIAM	QUILLOTA	REPOS	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLOTA (OBRAS CIVILES)	334	19-06-2009	18-05-2010		7.540	5.852.599.936	1.904.853.268	3.026.632.890	2.825.967.046
1785	José Pedro Urzúa P.	F.N.D.R.	QUILLOTA	ASESO	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLOTA (ASESORIA INSPECCION	270	27-03-2009	21-12-2009		0	11.781.000	0	0	11.781.000
1785	José Pedro Urzúa P.	F.N.D.R.	QUILLOTA	ASESO	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLOTA (ASESORIA INSPECCION	240	04-09-2009	01-05-2010		0	9.600.000	0	0	9.600.000
1785	José Pedro Urzúa P.	F.N.D.R.	QUILLOTA	ASESO	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLOTA (ASESORIA INSPECCION	240	04-09-2009	01-05-2010		0	14.400.000	0	0	14.400.000
1961	Luis A. Vásquez	F.N.D.R.	VALPARAISO	CONSE	Conservación torre de la Iglesia San Francisco del Barón	120	01-06-2010	28-09-2010		0	76.405.586	43.633.047	43.633.047	32.772.539
							Cttos.	7	8.455		7.160.499.213	2.715.573.208	4.010.268.603	3.150.230.610
TOTAL REGION							Cttos.	13	30.938		7.467.897.327	2.846.425.486	4.191.994.392	3.275.902.935

REGION DE LIBERTADOR B.O.

CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO				
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	
CONTRATOS DE DISEÑO															
334	1	Guido Silva Pérez	F.N.D.R.	RANCAGUA	IPYARQ	ICUARTEL DE LA P.A.E. RANCAGUA	125	28-09-2010	30-01-2011		0	13.000.000	3.900.000	3.900.000	9.100.000
333	1	Guido Silva Pérez	F.N.D.R.	PALMILLA	IPYARQ	MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS 7° CIA. PALMILLA	135	20-10-2010	03-03-2011		0	15.372.500	4.611.750	4.611.750	10.760.750
297	1	Rodrigo Vega Perez	F.N.D.R.- PATRIMON		IPYARQ	RESTAURACION PARROQUIA DE GUACARHUE	360	08-12-2009	02-12-2010		0	23.820.000	16.674.500	16.674.500	7.145.500
									Cttos.	3	0	52.192.500	25.186.250	25.186.250	27.006.250
CONTRATOS DE OBRA															
289	2	Carlos Eduardo Ferrer Jofré	F.N.D.R.- PATRIMON	PAREDONES	RESTA	IGLESIA SAN PEDRO DE ALCANTARA, COMUNA DE PAREDONES	640	29-10-2009	30-07-2011		1.235	936.607.572	538.007.499	628.490.688	308.116.884
294	2	Carlos Eduardo Ferrer Jofré	F.N.D.R.	PALMILLA	MEJOR	2° COMPAÑÍA DE BOMBEROS EL HUIQUE, PALMILLA	270	28-08-2010	24-05-2011		866	584.348.709	253.530.788	253.530.788	330.817.921
326	2	Jorge Rosales Flores	F.N.D.R.	PICHIDEGUA	REPOS	EDIFICIO CONSISTORIAL DE PICHIDEGUA III ETAPA	315	06-02-2010	17-12-2010		238	146.306.509	95.517.845	95.517.845	50.788.664
313	3	Jorge Rosales Flores	F.N.D.R.	NAVIDAD	REPOS	CUARTEL 1° COMPAÑÍA CUERPO DE BOMBEROS DE NAVIDAD	240	21-08-2010	17-04-2011		429	284.261.916	17.520.284	17.520.284	266.741.632
									Cttos.	4	2.768	1.951.524.706	904.576.416	995.059.605	956.465.101
TOTAL REGION									Cttos.	7	2.768	2.003.717.206	929.762.666	1.020.245.855	983.471.351

REGION DEL MAULE
CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO				
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	
CONTRATOS DE DISEÑO															
255	2	Enrique Rojo Fuentes	F.N.D.R.- BID - PATRIMON	PENCAHUE	IPYARQ	RESTAURACIÓN CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE BATUCO.	697	29-08-2009	26-07-2011		618	38.577.500	8.902.500	23.735.000	14.842.500
254	1	Pedro Encina Fariña	F.N.D.R.- BID - PATRIMON	EMPEDRADO	IPYARQ	PARROQUIA SAN IGNACIO DE EMPEDRADO	777	09-06-2009	25-07-2011		1.503	51.685.000	9.171.000	25.551.000	26.134.000
252	2	Pilar Matute Willemssen	F.N.D.R.- BID - PATRIMON	PENCAHUE	IPYARQ	RESTAUR. SANTUARIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE CORINTO, PENCAHUE.	699	01-09-2009	31-07-2011		1.008	37.180.000	5.148.000	19.448.000	17.732.000
257	2	Pilar Matute Willemssen	F.N.D.R.- BID - PATRIMON	CUREPTO	IPYARQ	PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE GUALLECO, CUREPTO.	707	29-08-2009	05-08-2011		1.088	37.180.000	8.580.000	22.880.000	14.300.000
253	1	Pilar Matute Willemssen	F.N.D.R.- BID - PATRIMON	CAUQUENES	IPYARQ	RESTAURACION IGLESIA SAN LUIS GONZAGA DE SAUZAL	768	18-06-2009	25-07-2011		1.044	41.355.500	7.443.300	20.470.800	20.884.700
270	1	Rodrigo Torres Vienne	F.N.D.R.	TALCA	IPYARQ	LICEO MARTA DONOSO ESPEJO DE TALCA.	315	14-01-2010	24-11-2010		17.157	158.000.000	23.700.000	23.700.000	134.300.000
							Cttos.	6			22.418	363.978.000	62.944.800	135.784.800	228.193.200
CONTRATOS DE OBRA															
193	2	Alejandro Pacheco	F.N.D.R.	PENCAHUE	REPOS	COMPLEJO EDUCACIONAL PENCAHUE	545	17-01-2009	15-07-2010		0	3.145.990.436	669.363.344	2.095.824.902	1.050.165.534
268	2	Andrés González	F.N.D.R.	LONGAVI	MEJOR	ESTADIO MUNICIPAL DE LONGAVÍ.	270	14-01-2010	10-10-2010		0	186.022.849	85.920.315	85.920.315	100.102.534
247	2	Andrés González	F.N.D.R.	LINARES	CONST	GIMNASIO SECTOR ORIENTE DE LINARES.	390	08-10-2009	01-11-2010		1.921	1.149.349.596	864.731.075	949.389.190	199.960.406
264	1	Carlos Madariaga Cabrera	F.N.D.R.	SAN JAVIER	CONST	EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURAS, SAN JAVIER.	420	03-11-2009	27-12-2010		1.098	1.042.331.946	960.570.218	960.570.218	81.761.728
263	1	Cesar Cepeda	MULTIPLE S FINANCIAM	CURICO	REPOS	REPOS. Y AMPL. C/EQUIP. ESC. E-22 URUGUAY, CURICO.	420	19-12-2009	11-02-2011		4.354	1.454.809.105	751.234.963	751.234.963	703.574.142
205	2	Enrique Rojo Fuentes	F.N.D.R.	PARRAL	HABIL	TEATRO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PARRAL.	390	05-01-2010	29-01-2011		1.997	927.188.971	483.060.855	483.060.855	444.128.116
218	4	Rodrigo Torres Vienne	MULTIPLE S FINANCIAM	PELLUHUE	REPOS	LICEO DE PELLUHUE.	450	30-10-2009	22-01-2011		7.559	2.896.333.014	1.431.216.826	1.431.216.826	1.465.116.188
							Cttos.	7			16.929	10.802.025.917	5.246.097.596	6.757.217.269	4.044.808.648
TOTAL REGION							Cttos.	13			39.347	11.166.003.917	5.309.042.396	6.893.002.069	4.273.001.848

REGION DEL BIO-BIO

CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO				
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	
CONTRATOS DE DISEÑO															
							Cttos.	0	0	0	0	0	0		
CONTRATOS DE OBRA															
206	1	Daniel Quilodran Fritz	F.N.D.R.		HABIL	MERCADO PROVISORIO DE TALCAHUANO	90	12-11-2010	09-02-2011		0	165.664.627	0	0	165.664.627
161	2	Daniel Quilodran Fritz	F.N.D.R.	YUNGAY	REPOS	INORMALIZACION Y AMPLIACION BIBLIOTECA PUBLICA DE YUNGAY	375	09-02-2010	18-02-2011		1.112	479.491.858	189.840.337	189.840.337	289.651.521
							Cttos.	2	1.112	645.156.485	189.840.337	189.840.337	455.316.148		
TOTAL REGION							Cttos.	2	1.112	645.156.485	189.840.337	189.840.337	455.316.148		

REGION DE LA ARAUCANIA

CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO				
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	
CONTRATOS DE DISEÑO															
392	1	Jaime Díaz	F.N.D.R.		PYARQ	POSTA SALUD RURAL EL LLUICO	120	09-07-2010	05-11-2010		0	5.465.000	4.372.000	4.372.000	1.093.000
394	1	María Cristina Caceres Vidal	F.N.D.R.- BID	GORBEA	PYARQ	CENTRO DE SALUD RURAL LASTARRIA	120	13-08-2010	10-12-2010		975	24.950.000	19.960.000	19.960.000	4.990.000
384	1	Maritza Barra	F.N.D.R.		PYARQ	POSTA SALUD RURAL PICHIPPELLAHUEN	120	09-07-2010	05-11-2010		0	5.397.000	3.238.200	3.238.200	2.158.800
410	1	Silvana Sánchez Budin	F.N.D.R.	VILLARRICA	ANALI	INVESTIGACION ARQUEOLOGICA SITIO HISTORICO	150	14-10-2010	12-03-2011		0	31.657.000	12.662.800	12.662.800	18.994.200
412	1	Jaime Díaz	F.N.D.R.	PITRUFQUEN	PYARQ	POSTA SALUD RURAL MILLAHUIN	120	09-07-2010	05-11-2010		0	5.570.000	4.456.000	4.456.000	1.114.000
422	1	Maritza Barra	F.N.D.R.	LAUTARO	PYARQ	REPOSICION POSTA SALUD RURAL MUCO CHUREO	180	09-07-2010	04-01-2011		0	5.603.000	4.482.400	4.482.400	1.120.600
423	1	Rene Mutizabal	F.N.D.R.	PERQUENCO	PYARQ	EDIFICIO MUNICIPAL	120	29-12-2010	27-04-2011		0	28.000.000	0	0	28.000.000
403	1	María Cristina Caceres Vidal	F.N.D.R.	FREIRE	PYARQ	CONSULTORIO GENERAL RURAL FREIRE Y ADECUACIÓN A CESFAM	160	25-12-2010	02-06-2011		0	42.000.000	0	0	42.000.000
383	1	Jaime Díaz	F.N.D.R.	CARAHUE	PYARQ	POSTA SALUD RURAL CATRIPULLI	120	09-07-2010	05-11-2010		0	5.465.000	4.372.000	4.372.000	1.093.000
312	2	Silvana Sánchez Budin	F.N.D.R.- BID - PATRIMONI	TEMUCO	PYARQ	INTEGRAL CASA DE MAQUINAS MUSEO NACIONAL FERROVIARIO	360	07-10-2009	01-10-2010		8840	90.000.000	31.500.000	63.000.000	27.000.000
316	1	Silvana Sánchez Budin	F.N.D.R.- BID - PATRIMONI	ANGOL	PYARQ	Y HABILITACIÓN EX HOSPITAL DE ANGOL Y SU ENTORNO	350	20-08-2009	04-08-2010		1720	37.510.000	7.502.000	26.257.000	11.253.000
									Cttos.	11	11.535	281.617.000	92.545.400	142.800.400	138.816.600

REGION DE LA ARAUCANIA
CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO				
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	
CONTRATOS DE OBRA															
402	1	Victor Sanhueza	F.N.D.R.		REPOS	JARDIN INFANTIL DIEGO PORTALES	300	11-08-2010	06-06-2011		654,98	489.441.256	220.000.000	220.000.000	269.441.256
424	1	Rene Mutizabal	F.N.D.R.	TEMUCO	CONST	HOSPEDERIA VARONES EN SITUACIÓN DE CALLE	300	25-09-2010	21-07-2011		0	537.013.037	115.704.430	115.704.430	421.308.607
425	1	Rene Mutizabal	F.N.D.R.	LONCOCHE	MEJOR	Y NORMALIZACIÓN ESCUELA ALBORADA	360	25-09-2010	19-09-2011		0	1.888.115.799	353.999.193	353.999.193	1.534.116.606
256	3	Jorge Mendez	F.N.D.R.	COLLIPULLI	REPOS	EDIFICIO CONSISTORIAL	360	25-12-2009	19-12-2010		2239	1.638.517.207	1.638.517.207	1.638.517.207	0
309	1	Rene Mutizabal	F.N.D.R.	MELIPEUCO	REPOS	EDIFICIO CONSISTORIAL	390	22-04-2009	16-05-2010		1329,8	989.005.140	225.919.140	989.005.140	0
310	3	Jorge Mendez	F.N.D.R.	ERCILLA	NORMA	CENTRO SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL	390	09-04-2010	03-05-2011		0	1.473.178.142	704.000.000	704.000.000	769.178.142
311	2	Victor Sanhueza	F.N.D.R.	RENAICO	NORMA	CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL	390	30-04-2010	24-05-2011		1581,91	1.613.236.503	561.000.000	561.000.000	1.052.236.503
255	2	Silvia González	F.N.D.R.	FREIRE	AMPLI	LICEO JUAN SCHLEYER C-31	600	31-12-2008	22-08-2010		5215,97	2.330.431.481	463.837.818	1.581.007.016	749.424.465
357	2	Juan Carlos Castillo Barra	F.N.D.R.	VICTORIA	REPOS	COMISARIA JUDICIAL POLICIA DE INVESTIGACIONES	345	10-12-2009	19-11-2010		703,8	741.162.325	728.162.325	741.162.325	0
									Cttos.	9	11.725	11.700.100.890	5.011.140.113	6.904.395.311	4.795.705.579
TOTAL REGION									Cttos.	20	23.260	11.981.717.890	5.103.685.513	7.047.195.711	4.934.522.179

REGION DE LOS RIOS

CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO			
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR
CONTRATOS DE DISEÑO														
342	1 Christian Pichaud Ojeda	F.N.D.R.		IPYARQ	IREPOSICION ESCUELA IFUSIONADA LOS LAGOS	185	08-07-2010	08-01-2011		0	70.203.603	35.101.802	35.101.802	35.101.801
340	1 Leyla Andrea Sade Calles	F.N.D.R.- BID - PATRIMON		ESAIE	RESTAURACION CASTILLO DE INIEBLA - VALDIVIA	250	07-10-2009	13-06-2010		0	101.574.000	70.921.800	70.921.800	30.652.200
								Cttos.	2	0	171.777.603	106.023.602	106.023.602	65.754.001
CONTRATOS DE OBRA														
334	1 Leyla Andrea Sade Calles	F.N.D.R.- BID - PATRIMON	INTERPROVINCIAL	DIAGN	PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGION DE LOS RIOS	275	24-04-2009	23-01-2010		0	81.389.000	40.694.500	73.250.100	8.138.900
26	1 MARCELA CHAMBLAS BUSTAMANTE	F.N.D.R.	CORRAL	REPOS	ESCUELA BASICA DE CORRAL	450	24-07-2010	16-10-2011		0	2.163.659.604	118.463.520	118.463.520	2.045.196.084
237	2 Nidia Morelli M.	F.N.D.R.	FUTRONO	REPOS	LICEO E INTERNADO DE LLIFEN	540	11-09-2009	04-03-2011		5.264	3.492.557.228	2.540.599.328	2.919.887.990	572.669.238
								Cttos.	3	5.264	5.737.605.832	2.699.757.348	3.111.601.610	2.626.004.222
TOTAL REGION								Cttos.	5	5.264	5.909.383.435	2.805.780.950	3.217.625.212	2.691.758.223

REGION DE LOS LAGOS

CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO			
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR
CONTRATOS DE DISEÑO														
339	1 Alexandra Stepanowsky	F.N.D.R.	FUTALEUFU	IPYARQ	AMPLI. ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA ENSEÑANZA MEDIA	195	29-10-2010	11-05-2011		1.400	45.350.000	0	0	45.350.000
313	1 Claudia Farias Maldonado	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	IPYARQ	AMPLI. REMOD. CONSULTORIO ANTONIO VARAS	679	02-06-2009	11-04-2011		993	49.544.014	0	23.970.000	25.574.014
358	1 Oliver Reinke Opitz	F.N.D.R. - BID - PATRIMON	PUERTO VARAS	IPYARQ	HABILITACION MOLINO MACHMAR PARA CENTRO CULTURAL	210	29-10-2010	26-05-2011		1.119	65.000.000	0	0	65.000.000
336	8 Ximena Garrido Jara	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	ESAIE	ESPECIALIDADES PARA EL DISEÑO CONST CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VICTIMAS DE VIF	60	30-09-2010	28-11-2010		587	7.850.000	0	0	7.850.000
								Cttos.	4	4.099	167.744.014	0	23.970.000	143.774.014
CONTRATOS DE OBRA														
341	1 Claudia Farias Maldonado	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	CONST	CENTRO ACONDICIONAMIENTO FISICO	300	16-11-2010	11-09-2011		0	1.172.538.348	0	0	1.172.538.348
								Cttos.	1	0	1.172.538.348	0	0	1.172.538.348
TOTAL REGION								Cttos.	5	4.099	1.340.282.362	0	23.970.000	1.316.312.362

REGION DE AYSEN

CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO			
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR
CONTRATOS DE DISEÑO														
								Cttos.	0	0		0	0	0
CONTRATOS DE OBRA														
166	LUIS SUAZO IROJAS	I.F.N.D.R.	AYSEN	CONST	POLIDEPORTIVO DE PUERTO AYSEN	510	30-06-2010	21-11-2011		5.985	5.093.370.456	467.109.829	467.109.829	4.626.260.627
								Cttos.	1	5.985	5.093.370.456	467.109.829	467.109.829	4.626.260.627
TOTAL REGION								Cttos.	1	5.985	5.093.370.456	467.109.829	467.109.829	4.626.260.627

REGION DE PUNTA ARENAS

CONTRATOS EN EJECUCION DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2010

Fecha de datos 03/01/2011

Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	INSPECTOR FISCAL	FINANCIAMIENTO	COMUNA	PROCESO	NOMBRE DEL CONTRATO	PLAZO VGTE.	FECHAS			M2	MOVIMIENTO FINANCIERO				
							INICIO	TÉRMINO	ITO		MONTO VIGENTE	INVERSIÓN AÑO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	
CONTRATOS DE DISEÑO															
							Cttos.	0	0	0	0	0	0		
CONTRATOS DE OBRA															
201	1101	F.N.D.R.	NATALES	NORMA	RETEN DOROTEA Y CASAS VIEJAS	120	30-11-2010	29-03-2011		0	129.338.910	0	0	129.338.910	
200	2	I Fabian Navarro Vera	F.N.D.R.	PORVENIR	REPOS	Liceo Polivalente hernando de Magallanes, Porvenir	350	21-08-2010	05-08-2011		0	4.118.773.328	537.126.400	537.126.400	3.581.646.928
119	2	IOsvaldo Medina Pérez	F.N.D.R.-IBID - PATRIMON	PUNTA ARENAS	NORMA	Y REPARACION CASA DE LOS INTENDENTES PUNTA ARENAS	210	08-09-2010	05-04-2011		972	504.216.075	0	0	504.216.075
116	4	IOsvaldo Medina Pérez	F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	REPOS	JARDIN INFANTIL CAPERUCITA ROJA, PUNTA ARENAS	200	17-08-2010	04-03-2011		874	603.229.327	64.583.879	64.583.879	538.645.448
222	1	Wannia Enssle Martinez	F.N.D.R.	NATALES	CONST	EDIFICIO MUNICIPAL EN PUERTO NATALES	310	01-05-2010	06-03-2011		1.875	1.676.290.555	1.054.365.594	1.054.365.594	621.924.961
							Cttos.	5	3.721	7.031.848.195	1.656.075.873	1.656.075.873	5.375.772.322		
TOTAL REGION							Cttos.	5	3.721	7.031.848.195	1.656.075.873	1.656.075.873	5.375.772.322		

