

# INVERSION DE MANDANTES Y PRESUPUESTO S SECTORIAL D.A. – FEBRERO 2011

DIRECCION DE ARQUITECTURA –DIV.PLANIFICACIÓN.  
*Oficina de Gestión*



Ministerio de  
Obras Públicas

## 1.- INVERSION DE MANDANTES Y SECTORIAL

### PRESUPUESTO SECTORIAL DE INVERSION

PROGRAMAS		CANT. DE PRY. POR PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	%
EG	Edificios Gubernamentales	2	1.121.062	3,56%
EM	Edificios MOP	41	11.126.575	35,29%
EP	Edificios Patrimoniales	9	3.818.206	12,11%
PE	Proyectos Especiales	11	15.458.724	49,04%
<b>TOTAL</b>		<b>63</b>	<b>31.524.567</b>	<b>100,00%</b>

El Presupuesto 2011 de Inversión inicial de la Dirección de Arquitectura, bajo el **Subtítulo 31** es de **M\$31.524.567. con un monto vigente a la fecha de M\$31.079.040.**

El presupuesto se estructura en 4 programas; 3.56% para Edificios Gubernamentales, 35.29% Ed. MOP, 12.11% Ed. Patrimoniales y 49.04% Proyectos Especiales.



A la fecha, la inversión es de M\$1.408.229, que corresponde a un avance del 5%, con un saldo por invertir de M\$ 29.670.811

La caja mensual de Febrero se ejecuta en un 97%

Aun no se registran inversiones en conservación

## INVERSION DE MANDANTES

La inversión a Febrero 2011 es de **M\$10.728.060**. Los **contratos vigentes son 196** ; 180 de arrastre del año anterior y 16 adjudicaciones a la fecha.

La inversión de este mes es de **M\$6.708.019**, representa el **11.86%** del saldo por invertir.



El avance financiero es del **61.07%** (inversión acumulada/monto vigente)

Del total de los contratos vigentes de mandantes, **los Gobiernos Regionales registran 122 Contratos**, equivalentes al **67.40%** de la cartera de contratos. La inversión alcanza a **\$5.887.251.-**, equivalente al **54.87%** del total nacional de la inversión de mandantes.

## CARGA FUTURA DE TRABAJO CON MANDANTES (Convenios Mandatados)

La carga futura de trabajo a corto plazo es de 154 mandatos; 57 diseños y 97 obras, con un **monto neto estimado para inversión de M\$143.005.514** y **gastos administrativos por M\$638.745-**

En la próxima pagina un resumen de la inversión, Sectorial y Mandantes

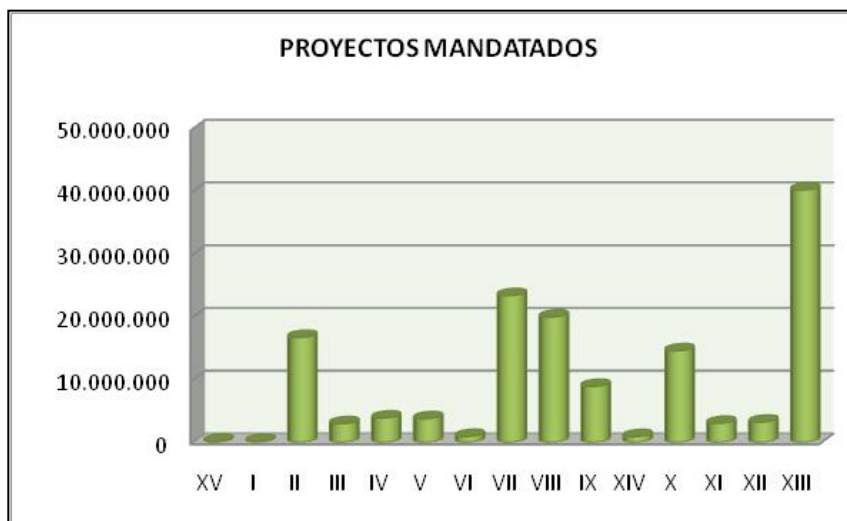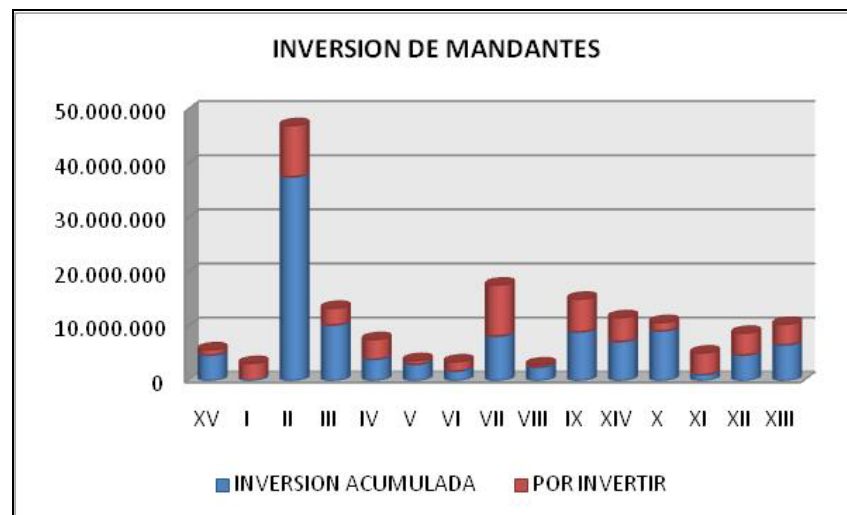

# INVERSION GLOBAL FEBRERO 2011 (SECTORIAL Y MANDANTES)

## RESUMEN DE LA INVERSION SECTORIAL Y MANDANTES

REGION	INVERSION SECTORIAL M\$					INVERSION DE MANDANTES EN M\$ FEBRERO 2011					TOTAL				
	CONT.	Presup. Vigente	INVERSION DEL AÑO	INVERSION ACUMULADA	POR INVERTIR	CONT.	MONTO VIGENTE	INVERSION DEL AÑO	INVERSION ACUMULADA	POR INVERTIR	CONT.	MONTO VIGENTE	INVERSION DEL AÑO	INVERSION ACUMULADA	POR INVERTIR
XV	3	1.201.062	616	616	1.200.446	9	5.694.369	105.734	4.694.321	1.000.048	12	6.895.431	106.350	4.694.937	2.200.494
I	1	45.000	0	0	45.000	5	3.160.883	0	49.250	3.111.633	6	3.205.883	0	49.250	3.156.633
II	2	85.000	0	0	85.000	11	47.089.718	676.328	37.607.914	9.481.804	13	47.174.718	676.328	37.607.914	9.566.804
III	3	157.344	0	0	157.344	6	13.356.171	1.056.834	10.264.856	3.091.315	9	13.513.515	1.056.834	10.264.856	3.248.659
IV	4	225.472	37.152	37.152	188.320	12	7.577.477	281.752	3.915.230	3.662.247	16	7.802.949	318.904	3.952.382	3.850.567
V	10	5.233.679	1.063.815	1.063.815	4.169.864	12	3.701.819	69.653	2.983.371	718.448	22	8.935.498	1.133.468	4.047.186	4.888.312
VI	4	2.944.002	0	0	2.944.002	13	3.463.476	343.569	1.740.890	1.722.586	17	6.407.478	343.569	1.740.890	4.666.588
VII	13	2.423.605	0	0	2.423.605	24	17.654.638	1.179.989	8.210.876	9.443.762	37	20.078.243	1.179.989	8.210.876	11.867.367
VIII	10	1.500.984	0	0	1.500.984	5	2.917.254	383.529	2.483.396	433.858	15	4.418.238	383.529	2.483.396	1.934.842
IX	3	436.000	0	0	436.000	24	15.033.155	1.934.991	8.992.629	6.040.526	27	15.469.155	1.934.991	8.992.629	6.476.526
XIV	5	1.646.566	297.306	297.306	1.349.260	16	11.613.520	842.559	7.207.288	4.406.232	21	13.260.086	1.139.865	7.504.594	5.755.492
X	3	111.000	0	0	111.000	25	10.720.552	879.815	9.178.177	1.542.375	28	10.831.552	879.815	9.178.177	1.653.375
XI	2	78.000	0	0	78.000	1	5.093.370	402.338	1.071.057	4.022.313	3	5.171.370	402.338	1.071.057	4.100.313
XII	2	106.313	0	0	106.313	10	8.747.519	1.518.079	4.705.769	4.041.750	12	8.853.832	1.518.079	4.705.769	4.148.063
XIII	16	14.760.522	9.340	9.340	14.751.182	8	10.393.652	1.052.890	6.583.661	3.809.991	24	25.154.174	1.062.230	6.593.001	18.561.173
NC	3	0	0	0	0	0				0	3	0	0	0	0
otros	0	124.491	0	0	124.491						0	124.491	0	0	124.491
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>31.079.040</b>	<b>1.408.229</b>	<b>1.408.229</b>	<b>29.670.811</b>	<b>181</b>	<b>166.217.573</b>	<b>10.728.060</b>	<b>109.688.685</b>	<b>56.528.888</b>	<b>265</b>	<b>197.296.613</b>	<b>12.136.289</b>	<b>111.096.914</b>	<b>86.199.699</b>
INVERSION EN MILES DE PESOS															
Otros: saldo por invertir .															

**Presupuesto Sectorial:** La Ley de Presupuesto en el Subtítulo 31 Iniciativas de inversión Item02 asigna un monto de M\$31.524.567. El presupuesto vigente, decretado a la fecha es de M\$31.079.040, Con una inversión de M\$1.408.229, correspondiente al 5%

**Inversión Mandantes:** Se registra movimientos en 181 contratos vigentes, con una inversión de **M\$10.728.060.-**, monto acumulado de M\$109.688.685 y un saldo por invertir de **M\$56.528.888.-**

## CONTRATOS DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCION

La Dirección de Arquitectura identifica 13 iniciativas de inversión de Reconstrucción , por un monto total de 6.747.561, además ha firmado convenios marco con mandantes para iniciar obras de Reconstrucción de Educación , Bomberos y PDI. Para esta cartera se generó un sistema de monitoreo que informa directamente, por lo que en este informe se entrega una síntesis a modo informativo..

### PROYECTOS SECTORIALES DE RECONSTRUCCIÓN

En relación a los 13 contratos de obras identificados como de Reconstrucción, en las regiones de Valparaíso, O´Higgins, Maule y Biobío, se registran:


- 1 CONTRATO TERMINADO EL AÑO 2010
- 8 contratos en licitación. En 4 de ellos, no se presentan oferentes.
- 4 contratos en Ejecución.
- Listado en anexos

### PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE MANDANTES

De acuerdo a los registros del **Seguimiento de Reconstrucción**, las regiones Maule y Bio-Bio identifican 85 iniciativas de inversión para reconstrucción con fondos de mandantes.

*La Región del Maule con 17 iniciativas, por un monto estimado de M\$ 22.675.520, con 2 contratos en proceso de licitación y el resto en gestión.*

*La Región de Bio-Bio con 68 registros, por un monto estimado de M\$19.240.480, con 7 contratos en ejecución, 2 en proceso de licitación, 1 suspendida, 51 programadas y 7 sin definir.*

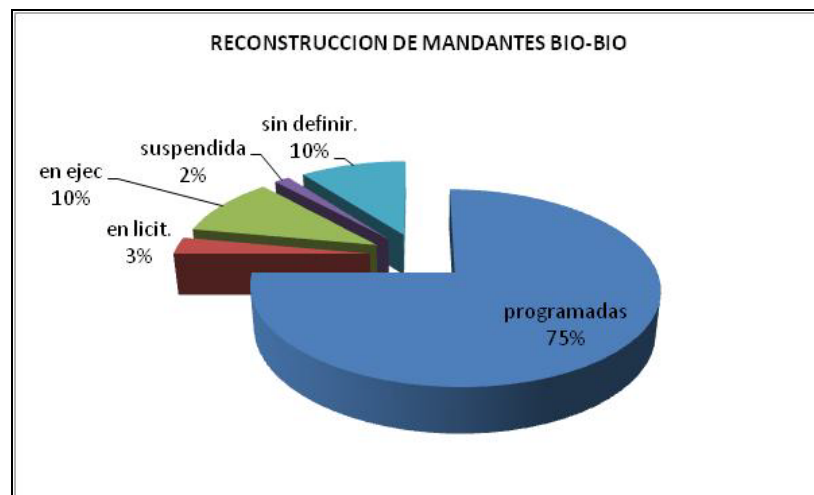

## LICITACIONES PROGRAMADAS

Se encuentra programados 17 llamados a licitación para el mes de Marzo **2011** por un monto total de M\$19.834.611


## LLAMADOS A LICITACION

En el mes se registran 9 llamados publicados en el Diario Oficial,( 3 obras, 4 diseños y 2 asesorías).

## DE LAS ADJUDICACIONES DE MANDANTES

Al mes de Febrero se encuentran adjudicados un total de 23 contratos, el 86,95% se han adjudicado al primer llamado. Por un total de **M\$ 9.331.286**

## MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y AUMENTOS DE PLAZO (Sectorial y Mandantes)

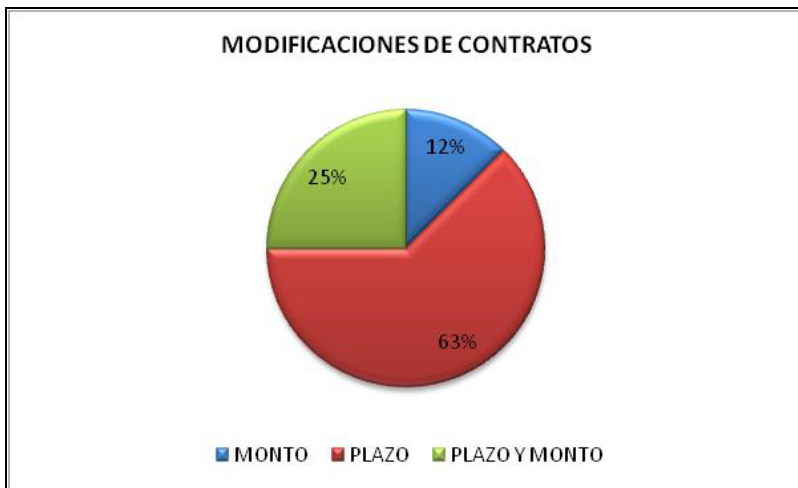

Al cierre del mes, se registran 32 modificaciones en 24 contratos, con un total de 4 modificaciones de montos, 8 modificación de montos y plazos y 20 modificaciones de plazo)

En relación a los 265 contratos vigentes a la fecha, representan el **9.06 % de contratos con modificaciones**

## INVERSION REGIONAL POR ETAPAS (EN GESTION, MANDATADOS, VIGENTES, SECTORIAL Y MANDANTES)

